

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation **(SAÉ) S2.05 : Gestion d'un projet**

Sujet : Organisation d'une Journée Universitaire sur le Numérique Responsable

PATHMARANJAN Kuruparan
KATEB Yacine
SERCEK Yusa

BUT Informatique Venus

Groupe de projet : M
Enseignant responsable du groupe : M. NGNOUWAL ELOUNDOU

S O M M A I R E

1. Cadrage du projet et compréhension du cas
2. Analyse des besoins et du périmètre du projet
3. Objectif du projet et livrables attendus
4. Acteurs du projet, organisation et
gouvernance
5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)
6. Découpage du projet en tâches (WBS)
7. Planification du projet et dépendance
8. Budget prévisionnel et arbitrages réalisés
9. Analyse des risques et modalités de suivi
10. Bilan prévisionnel et retour réflexif
11. Contribution individuelle et prise de recul
personnelle
12. Tableau de bord

1. Cadrage du projet et compréhension du cas

Projet : journée universitaire dédiée aux enjeux numériques responsables.

Ce projet consiste en une organisation d'une journée au cours de l'année scolaire dans l'université pour les étudiants et étudiantes sur les différents enjeux numériques. Cela dans le but de montrer la volonté de l'université pour renforcer le numérique responsable dans ses pratiques internes mais aussi pour sensibiliser les étudiants.

Comme tout projet, celui-ci comporte aussi des caractéristiques spécifiques tel qu'un cadre temporel c'est-à-dire planifié à une date fixe, le jeudi 14 mai. Il possède un budget limité à 2 000 €. C'est une journée unique et novateur car c'est la première édition portant sur ce sujet de découverte pour les étudiants et étudiantes. Il mobilise plusieurs acteurs internes comme externes tels que des professeurs, des associations et des experts.

Les différents facteurs d'émergence sont :

Tout d'abord, une projection vers le futur. En effet on a une date à laquelle tout doit être prêt, il faut donc se projeter vers cette date. On a un objectif clair de sensibiliser les étudiants sur lequel on mise dessus. On a différentes techniques et cadrage utilisés. Avec le service de logistique et de communication. De plus, plusieurs stratégies sont proposées tel que investir dans l'accessibilité, utiliser un format hybride. Enfin, on observe une forte inversion. En effet, le cadre de cette journée est très facile à modifier longtemps avant sa date, mais il est très difficile de la modifier à seulement quelques jours du projet.

La gestion d'un projet repose sur le triangle qualité, délai et coût :

- L'exigence sur la **qualité** est élevée ainsi, cette journée doit être visible auprès des étudiants, crédible et conforme aux valeurs.
- Le **délai** doit être respecté et reste non négociable (14 mai).
- Le **coût** ne doit pas dépasser le budget (2 000€) mais doit couvrir tous les services (support de communication, logistique d'accueil et prestation d'experts)

2. Analyse des besoins et du périmètre du projet

Tout d'abord, on observe des besoins réels. C'est-à-dire ce qui doit être résolu pour atteindre l'objectif : développer ces actions en faveur du numérique responsable, organiser, coordonner, planifier et arbitrer les différentes actions. Pour cela on nous demande la réalisation d'une journée universitaire dédiée aux enjeux numérique responsable et la conception d'une équipe en binôme capable de conduire à bon escient cet événements. Ce sont donc des besoins exprimés car ce sont ce que les acteurs demandent.

Ensuite, pour faciliter l'organisation des besoins, préciser les contraintes et fixer le cadre du projet, un cahier des charges est nécessaire. Il sera utilisé par tous les acteurs de ce projet.

1) Le contexte du projet :

Le présent cahier des charges présente le projet intitulé "Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants" a pour but de renforcer les actions de l'université sur le numérique responsable tout en sensibilisant les étudiants. Une journée dédiée à cet événement doit être organisée concentrant plus d'acteurs, tout en limitant les dépenses au budget donné.

2) Les besoins identifiés :

- Renforcer le numérique responsable sur l'établissement
- Montrer l'importance du numérique responsable aux étudiants

3) Les contraintes majeurs :

- La disponibilité du logistic (sales, matériels)
- Le respect d'une charte graphique pour les actions de promotion
- Le budget limité à 2 000 €
- La disponibilité des enseignants
- La participations des associations étudiantes
- L'accueil des acteurs extérieurs (associations, professionnels, experts)
- L'accueil des étudiants et du public extérieurs
- La participation de partenariat externes
- Le durée de l'évènement

4) Le périmètre :

- Le lieu de l'évènement (à l'université dans certains espaces)
- La concentration sur le thème à aborder
- Ne pas dépasser le budget donnée

5) Les parties prenantes principales :

- La direction de l'IUT
- Le service logistique
- Le service de communication
- Les associations étudiantes
- Les enseignants
- Les acteurs externes (associations, professionnels, experts)
- Les partenariats externes

- Les étudiants de l'université
- Le public externe

Dans le cadre de ce projet de « Journée sur le Numérique Responsable », nous retrouvons plusieurs parties prenantes.

Premièrement, nous avons les parties prenantes qui ont un pouvoir de validation sur le projet : la Direction de l'IUT ainsi que l'Université. En effet, la Direction de l'IUT est la partie prenante qui nous impose une date limite et qui commande principalement ce projet. L'Université, quant à elle, est la partie qui nous fixe un budget maximum de 2 000 euros. Ces deux parties prenantes sont les acteurs critiques du projet puisqu'ils ont un fort pouvoir ainsi qu'un fort intérêt, et leur but commun est de garantir la cohérence institutionnelle.

Deuxièmement, nous avons les services supports, constitués ici du service communication qui impose le respect de la charte graphique et une validation préalable. Cela crée une dépendance forte puisque si le service communication tarde à valider nos supports, tout le planning de diffusion prend du retard. Il faudra donc anticiper ces délais de validation dans notre planning. Le deuxième service est le service logistique qui doit gérer la disponibilité des salles et du matériel. Leur réponse dépend aussi du format (hybride ou présentiel) que nous allons choisir. Sans l'accord sur les moyens du service logistique, l'événement ne pourra pas se tenir sous la forme voulue. Ces services sont donc des acteurs à satisfaire car ils possèdent un fort pouvoir et un faible intérêt.

Troisièmement, nous retrouvons les intervenants. Ce groupe est composé des enseignants, qui sont intéressés par l'événement mais dont les disponibilités sont incertaines, et des associations étudiantes qui peuvent aider à mobiliser des participants. Elles sont bénévoles et ont des contraintes de calendrier. Enfin, on a les acteurs externes dont nous envisageons la participation mais sans aucun engagement ferme pour l'instant. Les intervenants sont donc des acteurs à mobiliser car ils ont un faible pouvoir mais un intérêt fort pour ce projet.

Enfin, nous retrouvons les bénéficiaires de ce projet qui sont les étudiants. Le but de cette journée est de les sensibiliser : plus le nombre d'étudiants sera élevé, plus nous saurons que l'événement est réussi. Les bénéficiaires sont donc aussi des acteurs à mobiliser car ils ont un faible pouvoir et un intérêt fort, cependant ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

3. Objectif du projet et livrables attendus

Objectif principale :

- Organiser et piloter une journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable le jeudi 14 mai 2026 intitulée « Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants » dans le but d'atteindre au moins 100 participants afin de sensibiliser les étudiants et tout autre public ; une feuille d'émargement sera utilisée pour mesurer le nombre de personnes.

Objectif secondaires :

- Garantir la visibilité de l'événement : Diffuser l'événement en imprimant et en affichant 30 affiches dans l'IUT tout en respectant la charte graphique et l'envoi d'un mail à tous les étudiants, qui doivent être validés par le service de communication au plus tard le 7 mai 2026.
- Respect de la date : Garantir la tenue de l'événement le jour indiqué, donc le jeudi 14 mai, en ayant validé la totalité des jalons critiques du planning de Gantt avant le soir du 13 mai au maximum.
- Maîtriser le budget : Gérer les 2 000 € sans aucun dépassement et présentation d'un bilan comptable le 20 mai 2026.
- Organisation des intervenants : Obtenir une confirmation de la participation d'au moins 3 intervenants internes ou externes et valider le contenu éducatif dont ils vont faire part avant le 30 avril 2026.
- Organisation du planning et coordination : Définir un planning de tâches grâce au WBS et au RACI, attribuer les tâches aux 3 membres de l'équipe projet d'ici le 15 avril 2026.
- Anticiper les risques et penser aux solutions : Établir une liste des 3 risques importants et probables avec leurs solutions avant le 30 avril 2026.
- Validation de la globalité de l'événement : Obtenir la signature de la direction de l'IUT sur le dossier final de l'événement au plus tard le 1er mai 2026.

Livrable principale :

- Dossier complet de conception et d'organisation de la journée universitaire
- Programme détaillé de l'événement (horaires, intervenants, thématiques)

Livrable intermédiaire :

- Mail officiel de communication envoyé aux étudiants
- Feuille d'émargement des participants
- Tableau de suivi des dépenses
- Liste des intervenants internes et externes
- Répartition écrite des rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe de projet
- Tableau d'analyse des risques (probabilité / gravité)
- Dossier de présentation soumis à la direction

Les éléments hors périmètre :

1) L'exécution des tâches

Le but est de gérer la coordination des actions, et non de les réaliser. Par exemple, l'équipe projet ne doit pas s'occuper des installations de matériel dans les salles ni du nettoyage après l'événement.

2) L'animation de la conférence

Même si l'équipe organise l'événement, elle n'est pas chargée d'animer la conférence et les interventions. C'est le rôle des professeurs et des associations partenaires.

3) Les décisions finales

L'équipe ne prend pas les décisions importantes toute seule. En effet, les décisions doivent être obligatoirement validées par la Direction de l'IUT.

4) La modification de la date de l'événement

La journée est fixée au jeudi 14 mai. Aucune modification ne peut être faite dans le périmètre.

5) Le dépassement du budget défini

Le budget maximal défini pour l'organisation de l'événement est de 2 000 €. Le dépassement de ce budget n'est pas autorisé pour l'événement.

4. Acteurs du projet, organisation et gouvernance

Acteurs :

- Chef de projet : Une personne du binôme choisie pour être le chef
- Équipe de projet : Binôme chargé de piloter le projet
- Program management office (PMO) : Direction de l'IUT qui fixe le budget et la date limite
- Maîtrise d'ouvrage (MOA) : Direction de l'IUT
- Maîtrise d'oeuvre (MOE) : Binôme chargé de piloter le projet (équipe de projet)
- Client : Les différents étudiants qui vont assister à la journée et autre public universitaire visé

Acteurs contributeurs :

- Service communication
- Service logistique
- Enseignants intervenants
- Associations étudiantes
- Acteurs externes (associations spécialisées, professionnels du numérique, experts du développement durable).

L'organisation de cette journée ne repose pas totalement sur l'équipe de projet car celui-ci n'a aucune autorité hiérarchique directe. C'est la direction de l'IUT et les services supports qui sont décisionnaires. L'équipe est chargée de l'organisation, la coordination, la planification ainsi que l'arbitrage des tâches.

Premièrement, il faut décider des différents ateliers, conférences, repas à mettre en place et de leur durée pour cette journée. Ensuite, les acteurs tels que les enseignants, les membres des associations, les experts et autres personnes qui doivent animer l'événement. Enfin, les logistiques nécessaires doivent être évaluées. Très important, les annonces doivent être réalisées.

Toutes ces informations doivent être transmises à la direction de l'IUT qui doit valider pour que le travail puisse commencer. Avant la validation finale par l'IUT, le service logistique doit confirmer la disponibilité des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la journée, le service de communication doit autoriser après vérification du respect de la charte graphique de la promotion. Enfin, il faut s'assurer de la disponibilité des acteurs (enseignants, intervenants, etc.) pour ne pas décevoir les étudiants.

Après validation par tous les services et la direction, l'équipe peut débiter l'organisation. Il faut faire attention à anticiper les éventuelles problématiques et trouver des solutions.

Dans ce projet, les prises de décision et les validations sont réparties de la manière suivante :

1) Le rôle de l'équipe projet :

Dans le cadre de cet événement, le rôle de l'équipe n'est pas de réaliser elle-même les tâches, mais plutôt d'organiser et de coordonner le projet. D'une part, l'équipe doit assurer la liaison entre tous les acteurs. D'autre part, l'équipe doit pouvoir imaginer plusieurs scénarios alternatifs et prévoir des marges de sécurité pour faire face aux imprévus ou aux décisions dont le résultat reste incertain. Enfin, elle a l'obligation de toujours pouvoir argumenter ses choix en fonction du contexte et des contraintes strictes, notamment l'enveloppe budgétaire et la date fixée.

2) Les circuits de validation obligatoires :

Afin d'avancer sans freiner le projet, l'équipe doit respecter ces circuits d'approbation :

- La Direction de l'IUT : Elle détient le pouvoir décisionnel final. Elle doit obligatoirement approuver les décisions prises pour le projet, tels que son nom et les messages communiqués, dans le but d'assurer la cohérence institutionnelle, donc en cohérence avec l'image renvoyée par l'université.
- Le service communication : Il doit accorder son approbation pour chaque action afin de s'assurer du bon respect de la charte graphique qui est un document officiel qui dit exactement comment l'université doit être représentée sur tous les supports.
- Le service logistique : Il confirme les choix de l'équipe et ses besoins matériels selon la disponibilité des salles et du matériel et du format choisi (hybride ou présentiel).

5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)

Légende :

- **R** (Responsible) : Celui qui réalise la tâche.
- **A** (Accountable) : Celui qui valide le travail et en porte la responsabilité finale (un seul par tâche).
- **C** (Consulted) : Ceux dont on a besoin de l'avis ou de l'expertise.
- **I** (Informed) : Ceux qui sont tenus au courant de l'avancement.

	Equipe projet	Direction de l'IUT	Service de Communication	Service Logistique	Intervenant (Enseignants, acteurs externes)	Associations étudiantes
Cadrage du projet	R (Yusa)	A	I	I	C	C
Validation du projet	R (Kuruparan)	A	I	I		
Création des support visuels	R (Kuruparan)	I	A/C			
Réservation du logistique (salles, matériels)	R (Yacine)	I		A/C	I	C
Invitation des intervenants	R (Kuruparan)	A			C	
Promotion et mobilisation	R (Yusa)	I	C			R/C
Gestion du budget (2 000€)	R (Yacine)	A/I	C	C		
Coordination le jour J (14 mai)	R/A (l'équipe)	I	I	R	R	R
Accueil et émargement le jour J	R (l'équipe)	I	I	I	I/C	R
Gestion des risque	R (Kuruparan)	I	I	C	C	I

	Equipe projet	Direction de l'IUT	Service de Communication	Service Logistique	Intervenant (Enseignants, acteurs externes)	Associations étudiantes
Remise en état du logistique	R (l'équipe)			A/C		C

Les responsabilités de l'équipe projet :

Dans ce projet, la responsabilité de l'équipe est d'obtenir obligatoirement des résultats concrets. Étant donné que c'est le responsable de l'événement, l'équipe projet a donc plusieurs obligations.

D'une part, elle doit respecter les contraintes. En effet, l'équipe doit faire en sorte que l'événement se déroule bien à la date fixée du jeudi 14 mai, et que les dépenses totales ne dépassent pas le plafond maximal autorisé de 2 000 euros.

D'autre part, elle doit assurer le bon déroulement du projet. Puisque même si elle ne réalise pas directement les tâches, l'équipe est responsable de l'organisation globale de l'événement. Cela signifie que si un intervenant manque ou qu'un équipement n'est pas réservé pour le projet, la responsabilité tombe sur l'équipe projet. C'est pour éviter tout problème d'organisation qu'au sein de l'équipe projet, les tâches ont été réparties.

Le chef d'équipe, à savoir Kuruparan s'occupe de faire les démarches pour que le projet, l'organisation proposée et cadré par Yusa soit validé par la direction de l'IUT ainsi, informer les services de communication et logistique du commencement du projet. Par la suite, la création des supports visuels est faite par Kuruparan et la réservation, l'achat du logistique par Yacine. Étant donné que Kuruparan s'occupe des démarches de communication, il s'occupe aussi de l'invitation des intervenants. Yacine gère le budget, donc c'est à lui d'évaluer les dépenses. Yusa s'occupe de la promotion de l'événement et la mobilisation des associations. Le jour de l'évènement, toute l'équipe sera mobilisée pour l'accueil, l'émargement, la coordination, le bon déroulement de cette journée ainsi que la remise en état du logistique. Enfin, Kuruparan interviendra au moindre problème.

Avec une telle organisation, cette journée se déroulera dans les meilleures conditions et permettra donc aux étudiants d'apprendre davantage sur le numérique responsable.

6. Découpage du projet en tâches (WBS)

1. Cadrage du projet

Livrable : Dossier complet de conception et d'organisation de la journée universitaire

- Définition du projet
 - Identifier les objectifs du projet
 - Rédiger les objectifs du projet (Kuruparan)
 - Identifier les différents acteurs du projet
 - Lister les acteurs internes et externes (Yacine)
 - Identifier les périmètres du projet
 - Rédiger le périmètre et hors périmètre (Yusa)
- Organisation de l'équipe projet
 - Répartir les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe
 - Rédiger le document de répartition des rôles (Yacine)
 - Organiser la coordination du projet (chef d'équipe)
 - Définir le chef de projet et les modalités de suivi (Kuruparan)
- Suivi du projet
 - Organiser le suivi des tâches
 - Créer un tableau de suivi (Yusa)
 - Identifier les risques liés au projet et trouver les solutions
 - Réaliser le tableau d'analyse des risques (Yacine)

2. Validation du projet

Livrable : Dossier de présentation soumis à la direction

- Préparation de la validation
 - Préparer le dossier de présentation du projet
 - Rédiger le contenu du dossier (Kuruparan)
 - Mettre en forme le document (Yusa)
- Présentation du projet
 - Présenter l'organisation de la journée universitaire
 - Préparer le support oral (Yacine)
 - Soumettre le dossier à la direction de l'IUT
 - Envoyer le dossier (Kuruparan)
- Validation finale
 - Obtenir la validation de l'événement
 - Suivre le retour de la direction (Yusa)

3. Organisation des interventions

Livrable : Programme détaillé de l'événement

- Identification des intervenants
 - Identifier les intervenants internes et externes
 - Créer la liste des intervenants (Yacine)
 - Contacter les intervenants
 - Envoyer les demandes de participation (Yusa)
- Planification des interventions
 - Confirmer la participation des intervenants
 - Relancer et suivre les réponses (Kuruparan)
 - Construire le programme de la journée (horaires, thématiques, interventions)
 - Élaborer le planning des interventions (Yacine)

4. Communication du projet

Livrable : Mail officiel de communication envoyé aux étudiants et affichage envisagé

- Préparation de la communication
 - Préparer le contenu du mail
 - Rédiger le mail (Yusa)
 - Préparer les affiches / flyers
 - Concevoir les supports (Yacine)
- Validation de la communication
 - Obtenir la validation du service communication
 - Envoyer les supports pour validation (Kuruparan)
- Diffusion de la communication
 - Envoyer le mail aux étudiants
 - Programmer et envoyer le mail (Yusa)
 - Coller les affiches
 - Vérifier la mise en place des affiches (Yacine)
 - Distribuer des flyers
 - Organiser la distribution des flyers (Kuruparan)

5. Gestion du budget

Livrable : Tableau de suivi des dépenses

- Préparation du budget
 - Identifier les dépenses nécessaires au projet
 - Lister toutes les dépenses (Kuruparan)

- Suivi du budget
 - Suivre les dépenses engagées
 - Mettre à jour le tableau (Yusa)
 - Vérifier le respect du budget fixé à 2 000 €
 - Contrôler les écarts (Yacine)
- Finalisation des comptes
 - Envoi des comptes à la direction de l'IUT
 - Envoyer le bilan financier (Kuruparan)


6. Suivi de la participation à l'événement

Livrable : Feuille d'émargement des participants

- Préparation du document
 - Préparer la feuille d'émargement
 - Créer le document (Yusa)
- Utilisation lors de l'événement
 - Mettre la feuille à disposition des participants
 - Vérifier la mise à disposition (Yacine)
 - Recueillir les signatures des participants
 - Superviser le remplissage (Kuruparan)

WBS de la journée Universitaire sur le Numérique Responsable

Journée Universitaire sur le Numérique Responsable

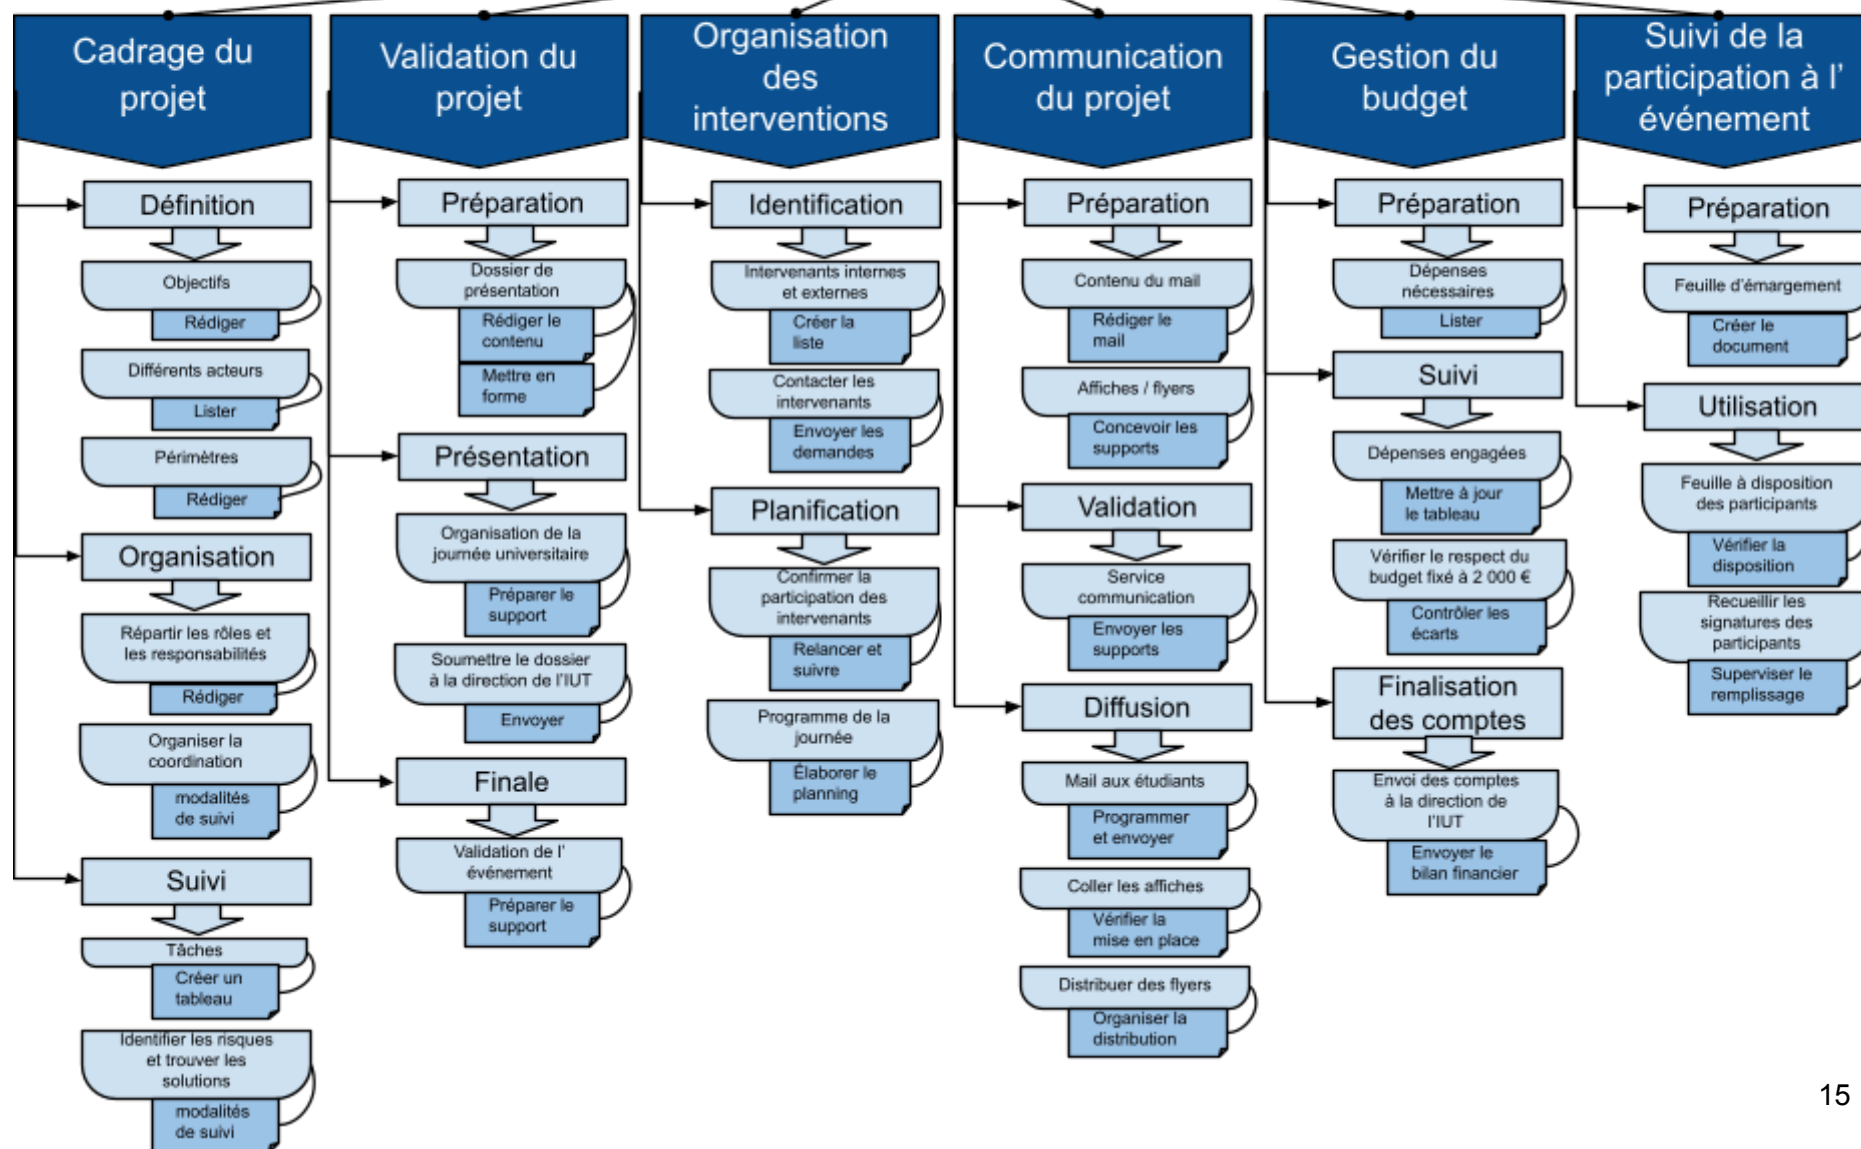

7. Planification du projet et dépendance

1) Planification du projet

Tout d'abord, nous allons commencer par le cadrage du projet en identifiant les objectifs, donc sensibiliser les étudiants au numérique responsable. Puis, les différents acteurs et les périmètre de ce projet. Ensuite, nous allons nous concentrer sur l'organisation de cet événement. Il faudra répartir les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe et que le chef de projet coordonner pour qu'il n'y ait pas de problème dans l'équipe et sur les actions que chacun doit réaliser. Pour que tout cela se réalise tranquillement, un suivi des tâches est très important car il permet d'identifier les risques.

Ensuite, un point important, la validation du projet par la direction de l'IUT et des services appropriés. Pour que la validation soit immédiate, il faut préparer le dossier de présentation du projet et le soumettre à la direction.

Dès la validation accordée, l'organisation peut débuter en commençant par la recherche d'intervenant. Si les intervenants ont été trouvés, une confirmation doit être faite quelques jours avant l'évènement.

Le point le plus important, la communication de cet évènement. Il faut réaliser les affiches, flyers et écrire les mails d'invitations. Ensuite, les transférer au service de communication pour l'obtention de la validation, seulement après lequel la publication peut être faite.

La gestion du budget, un des points les plus appuyés par la direction. Il faut identifier les dépenses nécessaires pour le projet, suivi celles-ci pour maîtriser la limite.

Enfin, le jour de l'évènement, une feuille d'émargement doit être mis en place pour avoir un nombre sur la participation.

2) Les dépendances critiques

- La validation finale :

L'exécution de la tâche "Envoyer le mail aux étudiants" est illogique tant que la tâche "Obtenir la validation de l'évènement" n'est pas strictement terminée. Il s'agit d'un point très important car lancer la communication sans l'accord de l'institution pourrait causer l'annulation du projet entier. Toute l'organisation de l'évènement repose sur ce jalon décisionnel.

- Le dossier de présentation :

La tâche "Préparer le dossier de présentation" est totalement arrêtée si les tâches "Construire le programme de la journée" et "Identifier les dépenses nécessaires" ont le moindre retard. Tout ce qui est dépassement du budget ou confirmation du planning des intervenants a un impact sur la date de rendu. Ce qui peut retarder grandement ou même empêcher la journée universitaire.

- L'engagement des intervenants :

La tâche "Construire le programme de la journée" est bloquée tant que la tâche "Confirmer la participation des intervenants" n'est pas complètement valide. Sans un engagement sûr, il est compliqué de faire une planification cohérente, ce qui stoppe instantanément la création du dossier de présentation et paralyse aussi l'ensemble du processus de validation institutionnelle.

3) Les jalons de validation

- Validation du programme et du budget :

Ce jalon de validation marque la fin de la préparation. On l'atteint quand les tâches "Construire le programme de la journée" et "Identifier les dépenses nécessaires" sont terminées. C'est un point très important car ça prouve que l'équipe a toutes les informations concrètes pour créer le dossier de présentation.

- Validation finale par la direction de l'IUT :

C'est le jalon décisionnel le plus important du projet. Il arrive au moment où la tâche "Obtenir la validation de l'événement" est terminée. Atteindre ce jalon de validation permet de débloquent toute la communication publique.


- Validation de la communication officielle :

Ce jalon de validation est placé dès que la tâche "Envoyer le mail aux étudiants" est réalisée. Après cette étape, c'est très compliqué de faire des changements sur le programme ou d'avoir du retard sur la date.

- Validation opérationnelle de l'événement :

Toute l'organisation de l'événement repose sur la date fixée depuis le début. Ce jalon de validation se met en place directement concrètement, notamment avec la tâche "Recueillir les signatures des participants".

4) Le diagramme de Gan

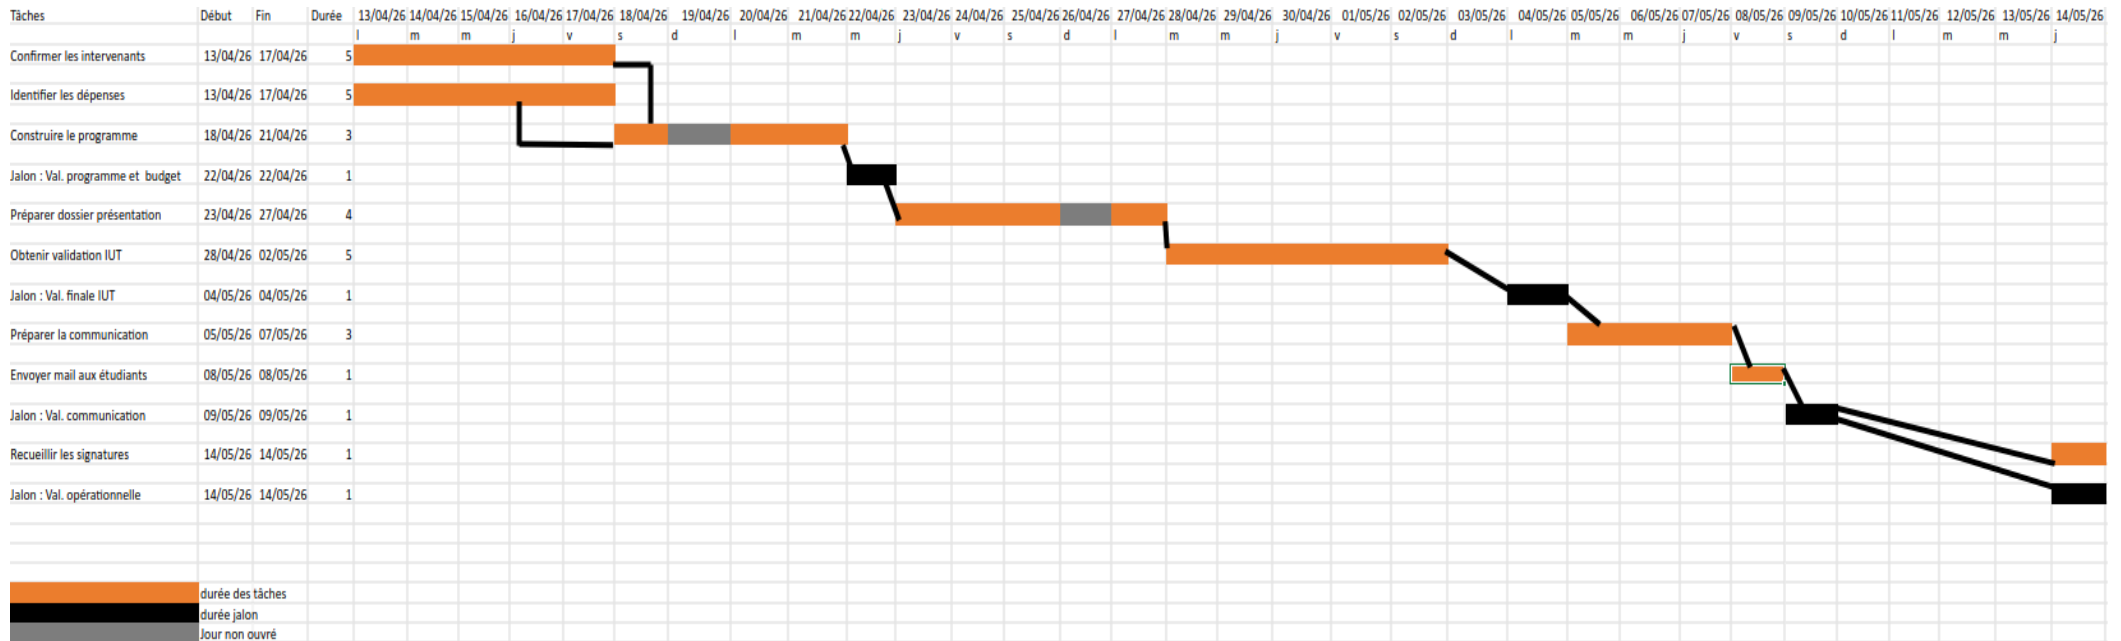

8. Budget prévisionnel et arbitrages réalisés

Nous avons un budget fixé de 2000 euros ;

Tout d'abord, nous allons réserver un montant de 500 euros pour les différents intervenants externes. Comme nous n'avons pas eu de détails supplémentaires concernant les frais de transport ou de déplacement, certaines personnes, telles que les associations, n'auront peut-être pas la possibilité de se déplacer à leurs frais. Nous allons donc garder une marge assez haute de 500 euros pour cela.

De plus, pour le service de communication, nous allons accorder un montant de 300 euros. La communication concerne l'impression des affiches, la conception des flyers et les outils de diffusion numérique. Ces dépenses permettent d'assurer la visibilité de l'événement auprès des étudiants.

Nous allons également conserver 600 euros pour tout ce qui concerne le matériel et la logistique. Il faut compter 300 euros pour la location ou l'achat de matériel : vidéoprojecteur, enceinte, etc. 100 euros pour les différentes fournitures : badges consacrés à l'événement (peut aussi compter dans la partie communication). Et 200 euros pour aménager les différents espaces. En effet, il faut pouvoir aménager les différents espaces tels que le forum et les différentes salles qui pourront être utilisées. Pour cela, il faut une certaine main-d'œuvre pour faire l'aménagement et le nettoyage.

Enfin, pour le reste, soit 300 euros, nous allons le garder en tant que marge de sécurité. En effet, il se peut que le matériel tombe en panne. Cela nous permet de toujours maîtriser le budget même en cas d'imprévu.

9. Analyse des risques et modalités de suivi

Tout d'abord, le risque que l'on peut rencontrer est que l'on n'arrive pas à rassembler tous les acteurs du projet. En effet, le public, s'il n'est pas intéressé, ne participera pas et ne sera pas sensibilisé. De plus, si on n'arrive pas à s'organiser avec les différents contributeurs tels que les enseignants et les associations, cela peut poser problème. On est donc sur un risque organisationnel, car c'est par faute d'une mauvaise organisation des activités et d'une mauvaise organisation entre les contributeurs que cela peut arriver. Les origines de ce risque sont un public instable et un créneau serré pour rassembler tous les contributeurs.

En conséquence, une partie du public pourrait partir en plein milieu de la journée ou ne même pas y assister, et la gestion des activités serait difficile, car sans tous les acteurs, il faudra gérer plusieurs activités, même celles que l'on ne maîtrise pas. C'est donc une conséquence sans gravité, car cela n'implique pas de coût supplémentaire : la journée sera quand même réalisée.

Pour cela, nous proposons de réaliser un questionnaire sur les centres d'intérêt des étudiants afin d'adapter notre journée pour qu'elle soit un minimum intéressante. Nous proposons également de faire passer une feuille qui demande si l'étudiant sera présent. Pour les contributeurs, on propose aux associations de les mettre en avant pendant la journée. Ainsi, on pourra inciter les personnes qui répondront absentes à venir.

Ce risque est peu détectable, car même avec ce questionnaire, nous ne pouvons pas confirmer que la journée leur plaira et les sensibilisera. Les contributeurs ne sont pas forcément disponibles le 14 mai et les associations peuvent ne pas être intéressées. On a donc une probabilité d'apparition de 3, une gravité de 2, une probabilité de non détection de 3. Ce qui nous fait une criticité de 18. Ce risque est surveillé en priorité et il faut mettre en place nos solutions apportées au plus vite.

De plus, un des risques est de ne pas pouvoir garantir la visibilité de l'événement. C'est également un risque organisationnel, car il est dû à une mauvaise organisation entre l'équipe projet et le service de communication. Les origines de ce risque peuvent être un manque d'expérience dans la communication ou une communication réalisée trop tard. Les conséquences sont un manque de visibilité de l'événement, ce qui peut impliquer un public plus restreint.

Pour cela, on peut imposer plusieurs livrables liés à la garantie de la visibilité de l'événement. Ce risque est détectable tôt, car on pourra observer si, à l'université, on parle de cette journée ou voir si des communiqués ont été envoyés pour présenter la journée. Il est peu probable qu'il apparaisse, car des livrables sont déjà en lien avec la communication de l'événement, mais il n'est pas impossible qu'il apparaisse, car un retard sur les livrables peut déclencher ce risque. On a donc une criticité de $2 \times 2 \times 2$, c'est-à-dire 8 : le risque est maîtrisable.

Un autre risque lié à cette journée est que la journée ne soit pas prête pour le 14 mai. Ce risque peut être de plusieurs natures : organisationnelle, technique et

budgétaire. Il peut survenir par manque de temps. Ce risque implique soit de reporter la journée, donc de retrouver un créneau pour tous les acteurs, soit que la journée soit annulée.

En plus des différents livrables, on peut faire en sorte que le projet soit fini 10 jours avant sa présentation afin d'avoir une marge pour régler des problèmes qui peuvent survenir. Il est très peu probable, car il y a plusieurs livrables à rendre tout au long du projet, dont des livrables principaux. Grâce à ces livrables, il est facilement détectable, car on pourra se situer par rapport aux différents délais. Avec des conséquences importantes de niveau 5, on a donc une criticité de $1 \times 1 \times 5$, soit 5 : le risque est faible et maîtrisable.

On a également un risque financier lié à la maîtrise du budget. Les origines sont un contexte réglementaire instable. En effet, le budget de 2 000 euros peut facilement être dépassé. Cela implique des coûts supplémentaires, car pour certaines parties du projet, il n'y aura plus de budget. C'est donc une conséquence de niveau 3. Ce risque est peu probable de se réaliser, car la direction de l'IUT insiste beaucoup sur le respect du budget. Comme solution, nous avons proposé un livrable avec un tableau de suivi des dépenses. Ce risque est détectable très tôt, car on voit le budget descendre petit à petit au fur et à mesure des achats. On a une criticité de $1 \times 2 \times 3$, soit 6 : risque faible et maîtrisable.

Pour garantir la réussite de ce projet, plusieurs modalités de suivi ont été mis en place:

- Le diagramme de Gantt a permis d'avoir un suivi régulier sur l'avancement de chacune des tâches et les retards. Il nous a aussi permis d'identifier les impacts sur les tâches qui dépendent d'autres qui n'ont pas été terminées à temps.
- Notre équipe projet, est restée en contact pour avoir un suivi de l'avancement et est intervenue dès le moindre problème.
- Les livrables, qui ont été réalisés, ont permis de valider chaque tâches réalisées afin de confirmer la conformité avec les attentes de la direction de l'IUT.
- Le contact avec les intervenants, nous a permis de n'avoir aucun problème le jour J sur l'intervention d'une personne. Même lors des petits soucis, des solutions ont été trouvées.

Tous ces modalités ont permis d'assurer une gestion rigoureuse tout en anticipant les problèmes pour garantir la réussite de ce projet

10. Bilan prévisionnel et retour réflexif

Notre principal objectif était d'organiser, piloter et réussir cette journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable afin de sensibiliser les étudiants. Pour atteindre cet objectif, nous nous étions fixés des objectifs secondaires : attirer le plus de public en garantissant la visibilité de l'évènement (affiche/flyers/mail réalisé), ne pas modifier la date attribuée (14 mai), maîtriser le budget donné (2 000€), faire intervenir des acteurs internes et externe, s'organiser avec un planning et une liste de tâches à réaliser, tout en anticipant les risques. Tous ces objectifs ont été atteints après la validation du projet par la direction de l'IUT. Cette réussite est visible dans le travail remis par ce rapport structuré et dense.

Le Cahier des Charges : Il a servi de base de référence pour lister les besoins fonctionnels et techniques du projet.

Le WBS : Ce document a été notre point de départ. Il nous a permis de décomposer le projet en tâches simples, évitant ainsi l'oubli de détails logistiques comme le recueil des signatures ou la préparation des mails.

Le Diagramme de Gantt : Produit via Excel, ce livrable est notre outil de gestion du temps. Il permet de visualiser l'enchaînement des tâches et de s'assurer que l'évènement du 14 mai est faisable dans les délais, tout en tenant compte des jours ouvrés, le samedi et le dimanche .

Le Budget prévisionnel : Ce tableau permet de garantir la répartition des 2 000 € entre la communication, la logistique et le défraiement des intervenants.

Les supports de communication : Nous avons également préparé les brouillons des mails d'invitation et les maquettes des affiches, qui sont prêts à être déployés dès la validation finale de l'IUT.

Le respect du planning a été l'un des enjeux majeurs de cette SAE et pour cause on ne pouvait pas déplacer la date fixée qui est le jeudi 14 mai. Si on analyse notre diagramme de Gantt nous pouvons remarquer que :

- Tout retard sur la validation institutionnelle a un impact direct sur l'évènement et aussi sur le nombre de participants.
- Nous avons fait le choix stratégique de clôturer la phase de communication le 8 mai. Cela nous laisse 4 jours ouvrés avant l'évènement. Cette pose dans le planning est volontaire : il permet de gérer les inscriptions de dernière minute et de finaliser des éventuels problèmes logistique.
- Le planning a été construit en jours ouvrés. En excluant les samedis et dimanches, nous avons obtenu une vision de la charge de travail réelle pour cet évènement.
- Chaque jalon de validation a été placé de manière à servir de temps de validation et de points de contrôle. Si un jalon n'est pas atteint à la date prévue, nous savons directement que nous devons accélérer pour rattraper le retard sur la tâche suivante.

Nous avons réussi à mobiliser les 2 000 euros de budget attribués dans les différents services de logistique, de communication et dans la mobilisation de matériel. Nous avons également prévu de mettre en place des services pour aménager et nettoyer tous les espaces dédiés. Nous avons gardé une part de 300 euros pour prévoir tout problème qui pourrait arriver, qu'il soit technique, tel qu'une panne.

Nous avons réussi à définir les différents risques liés aux acteurs externes et internes de la journée. Nous avons montré que ne pas pouvoir rassembler les acteurs nous apporterait plusieurs problèmes qui mettent en danger la journée universitaire.

De plus, nous avons montré qu'il est impératif de réaliser une bonne communication de l'événement. En effet, un manque de communication ne mettrait pas en avant la journée universitaire et aurait moins d'impact.

Enfin, nous avons montré que le respect du budget et des délais est crucial pour la journée universitaire. En effet, ces deux aspects permettent de prévoir tout imprévu lié à la journée, tel que des problèmes techniques ou autres.

11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle

- PATHMARANJAN Kuruparan :

Dans ce projet mon implication a débuté en tant que chef d'équipe, j'ai dû répartir les étapes puis les regrouper pour les remettre en forme afin d'avoir un rendu uniforme. En tant que membre du groupe, j'ai réalisé mon travail aussi, en commençant par l'analyse des besoins, des parties prenantes, du périmètres et des contraintes.

Ensuite, j'ai continué avec la définition de l'objectif principal et des objectifs secondaires qui nous ont permis d'éclaircir les attentes et vers quel but nous devons nous diriger.

En ajoutant à cela, j'ai rédigé l'organisation de cet évènement c'est-à-dire les différentes étapes pour que cette journée se déroule sans aucun problème, dans les meilleures conditions.

Puis, la répartition des rôles et des responsabilités avec le RACI, m'a permis et à mon groupe d'avoir un aperçu sur les tâches de chaque individu (direction, services). Avec cela, j'ai réalisé le découpage du projet en tâche (WBS) sous forme arborescente.

Enfin, j'ai calculé les dépenses envisagées tout en restant dans le budget (2 000€) et j'ai réalisé un point sur nos modalités de suivi de ce projet pour réussir au maximum.

Tout au long de ce projet, grâce à la rédaction de ce rapport, j'ai su diriger un petit groupe ainsi j'ai développé mes qualités de travail d'équipe. La rédaction d'un rapport par différentes étapes est une nouvelle méthode que j'ai apprise. Ainsi, cette SAE m'a permis d'apprendre les différentes situations qu'on peut rencontrer et la manière dont il faut agir. Il m'a permis d'étudier les problèmes qui suscite de se produire ainsi anticiper et y trouver les meilleures solutions.

- KATEB Yacine :

Tout d'abord, j'ai été chargé de réaliser le cadrage du projet et la compréhension du cas. Cela m'a permis d'appréhender de manière claire le sujet. En effet, cette journée a bien été définie comme un projet pour moi grâce à cette partie, avec les délais et le budget à respecter.

Ensuite, grâce aux définitions des objectifs par mon coéquipier, j'ai pu définir les différents livrables (principaux et secondaires) en lien avec tous les objectifs.

Par la suite, j'ai défini les différents acteurs internes et contributeurs. Cela m'a permis de comprendre que l'équipe de projet ne suffit pas à elle seule pour contrôler l'avancement du projet. Il faut la confirmation de la direction, des intervenants, des enseignants, etc.

De plus, j'ai découpé le projet en WBS. Cette WBS m'a permis de comprendre que cet outil était indispensable pour mener à bien un projet. En effet, elle permet d'illustrer chaque partie de l'événement, telle que la communication, le budget ou encore les délais. Cette arborescence permet de lire les différentes étapes organisationnelles du projet plus facilement.

Grâce à cette WBS, j'ai pu définir le budget prévisionnel de manière efficace et simple. En effet, grâce à l'arborescence du WBS, il est plus simple d'associer chaque partie du budget à une branche de l'arbre.

Enfin, j'ai défini les différents risques liés au projet. Cela m'a permis de me rendre compte à quel point la mauvaise gestion des acteurs, du budget et des différents délais peut détruire un projet facilement.

Cette SAE m'a permis d'apprendre tous ces points cités, mais plusieurs difficultés ont également été rencontrées. En effet, en tant que jeune étudiant, il était parfois compliqué de se mettre à la place d'une personne qui gère un projet. De plus, certains aspects étaient nouveaux et inconnus, tels que le WBS ou la matrice RACI.

- SERCEK Yusa :

Tout d'abord, je me suis occupé d'identifier les parties prenantes, en listant les acteurs du projet tout en acceptant que certains points soient flous. J'ai rencontré des difficultés lors de cette partie à cause justement de ces points flous, mais aussi parce que je trouvais beaucoup de parties prenantes et il fallait que j'en oublie aucune. Cette partie m'a fait comprendre que beaucoup plus de personnes morales ou physiques participent à des projets que ce que je pensais, et que si elles n'étaient pas toutes en harmonie, un projet serait quasiment impossible à réaliser.

Puis, je me suis occupé de définir tout ce qui était hors périmètre, donc ce dont nous ne devons pas nous occuper avec mon équipe. C'était un peu compliqué à trouver parce que j'avais l'impression qu'on devait tout faire, mais au fur et à mesure de mon apprentissage en gestion, j'ai finalement trouvé cette difficulté normale. Cela m'a aussi permis de comprendre que, dans un projet, il ne faut pas croire que je dois tout faire, c'est pour ça qu'un cadrage du projet est essentiel, mais que je peux et je dois compter sur les autres acteurs du projet, car je ne dois réaliser que ce qui m'est obligatoire.

Ensuite, je me suis occupé de la gouvernance du projet, donc du rôle qu'a l'équipe projet. Cela reposait sur deux parties : la première est ce que l'équipe doit faire et la deuxième sur ce qu'elle doit respecter. En effet, il faut des validations de certains acteurs critiques pour faire avancer ce projet. Je n'ai pas eu de difficulté sur cette partie, les informations étaient accessibles.

Après cela, je me suis occupé des responsabilités de l'équipe projet, donc de ses obligations et de ce qu'elle doit respecter. De même que pour la gouvernance du projet, je n'ai pas eu trop de difficulté sur cette partie. Ces parties m'ont fait comprendre que les acteurs, critiques ou pas, sont très importants. Oui, nous sommes l'équipe projet, mais sans leur validation institutionnelle, il est trop difficile pour une équipe projet d'en réaliser un. Il faut faire attention aux obligations que l'équipe a et qu'il faut absolument respecter.

Pour finir, j'ai dû m'occuper de la réalisation des dépendances critiques liées à nos tâches WBS, ainsi que de l'ajout des jalons de validation et finalement du diagramme de Gantt. Cette partie est celle que j'ai trouvée la plus compliquée car je

devais décider si une dépendance était critique ou pas ; ce n'était pas facile à repérer. Savoir où placer les jalons était plus simple, mais le diagramme de Gantt était vraiment plus complexe. Je l'ai réalisé sur Excel avec difficultés. Cependant, cela m'a apporté des connaissances sur Excel que je n'avais pas, ce qui m'a rendu meilleur sur cet outil. Cela m'a aussi montré que répartir son temps correctement en ajoutant des jalons est la clé pour réussir et pour pouvoir aussi gérer ses dépendances critiques.

Pour conclure je pense que la réalisation de ce projet m'a été très bénéfique et je pense que ça va beaucoup m'aider pour mes futurs projets en BUT Informatique ainsi que dans le monde du travail par la suite.

12. Tableau de bord

Date de publication	Numéro de livrable	Contenu du livrable
13/02/2026	Livrable 1	Cadrage du projet et compréhension du cas
		Analyse des besoins et du périmètre du projet (cahier des charges)
07/03/2026	Livrable 2	Objectif du projet et livrables attendus
		Acteurs du projet, organisation et gouvernance
		Répartition des rôles et responsabilités (RACI)
		Découpage du projet en tâches (WBS)
24/03/2026	Rapport final	Planification du projet et dépendance
		Budget prévisionnel et arbitrages réalisés
		Analyse des risques et modalités de suivi
		Bilan prévisionnel et retour réflexif
		Contribution individuelle et prise de recul personnelle
29/03/2026	Rapport final (corrigé)	Correction suggéré réalisé

#Retour au début
